







CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 1 di 20

Concetto: PROVE ROUTINE IN FABBRICA

### **CONTROLLO EDIZIONE**

EDIZIONE	MOTIVO	DATA
-	Edizione	01-11-2015
А	Aggiornato punti 6.2-6.3-Tabela I.4.1	24-05-2016
В	Correzioni traduzione	08-06-2016
С	Cambio formato	22-06-2016

### **DISTRIBUZIONE**

Direzione del progetto	(A. URRIZA)
Responsabile per il progetto tecnico	(A. BALDA)
Responsabile della Qualità	(M. BUCCARELLA)
Ingegnere Area Sistemi	(A. FAGET)
Responsabile produzione	(J.C. GONZÁLEZ)
Responsabile prove dei treni	(A. CARDINALE)

Eseguito da:

Nome: F. IRASTORZA

Firma:

**Data:** 22-06-2016

Verificato da:

Nome: M. BUCCARELLA

Firma:

**Data:** 22-06-2016

Approvato da:

Nome: A. EGUIZABAL

Firma:

**Data:** 22-06-2016

Mod. 11.02.BZ-02 C

## **C4**F

## PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**





CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 2 di 20

## INDICE

1.	;	SC	OPO	3
2.		API	PLICAZIONE	3
3.	ı	RIF	ERIMENTI	3
4.		AΤ	TREZZATURE	3
5.	(	CO	NDIZIONI INIZIALI	3
6.	ı	PR	OCEDIMENTO DI ISPEZIONE	3
	6.	1.	GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI	3
	6.2	2.	DISTANZE DI ISOLAMENTO E LINEE DI FUGA	4
	6.3	3.	INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI	6
	6.4	4.	PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE	8
	6.5	5.	CIRCUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI	9
	6.6	6.	MORSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI	9
	6.7	7.	FUNZIONAMENTO MECCANICO	9
	6.8	8.	CABLAGGIO, COMPORTAMENTO D'ESERCIZIO E FUNZIONALE	.10
Α	LLI	EG	ATO I - RISULTATI OTTENUTI NELL'ISPEZIONE DI SERIE DELL'ARMADIO LV1 .	.11
1.	(	GR.	ADO DI PROTEZIONE	.12
2.	I	DIS	STANZE DI ISOLAMENTO E LINEE DI FUGA	.12
3.	ı	INT	EGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI	.13
4.	I	PR	OTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE	.16
5.	(	CIR	CUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI	.17
6.			RSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI	
7.	I	FUN	NZIONAMENTO MECCANICO	.18
8.	(	CAI	BLAGGIO, COMPORTAMENTO D'ESERCIZIO E FUNZIONALE	.19
۸		EC	ATO II - CONCLUSIONE	20









CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 3 di 20

#### 1. SCOPO

Lo scopo di questo protocollo è quello di descrivere le attività di ispezione di serie da effettuare su ogni armadio LV1. Il protocollo include i fogli di raccolta dati del risultato di tali ispezioni.

#### 2. APPLICAZIONE

Questo protocollo di ispezione è applicabile agli armadi LV1.

#### 3. RIFERIMENTI

Norma EN 61439:2009 Insieme dei quadri a bassa tensione – Regole generali

Documenti CAF
 B.20.83.005.00: Armadio LV1

B.20.77.141.01: Elenco dei cavi LV1

B.20.94.765.00: Documento giustificativo della norma EN

61439-1:2009 per l'armadio LV1

#### 4. ATTREZZATURE

• Elementi necessari per aprire meccanicamente le porte.

#### 5. CONDIZIONI INIZIALI

• L'armadio deve essere montato con tutti i suoi componenti, in posizione verticale, appoggiato sulla base e non sottoposto a tensione.

#### 6. PROCEDIMENTO DI ISPEZIONE

#### 6.1. GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI

Verifiche

Ispezionare visivamente l'involucro e i dispositivi accessibili dell'INSIEME e verificare che questi coincidano con quelli del disegno B.20.83.005. Indicare se sono presenti malformazioni o se le aperture sono danneggiate a tal punto da influire sul grado di protezione dell'armadio.

Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 1 dell'Allegato I.





PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 4 di 20

#### 6.2. DISTANZE DI ISOLAMENTO E LINEE DI FUGA

#### Verifiche

Ispezionare visivamente le piastre 1 e 2, osservando che siano rispettate la geometria e la posizione indicate nel disegno B.20.83.005, rispettivamente posizioni 18 e 17 dell'Immagine 6.3.1. Osservare nei dettagli le immagini 6.2.2 e 6.2.3.

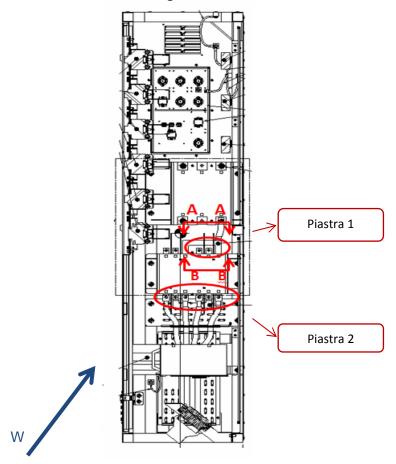


Immagine 6.2.1 – Piastre di rame





**LOCOMOTIVA E401** 



CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 5 di 20

### Immagine 6.2.2 – Distanze di isolamento piastra 1





Immagine 6.2.3 – Distanze di isolamento piastra 2



#### • Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 2 dell'Allegato I.

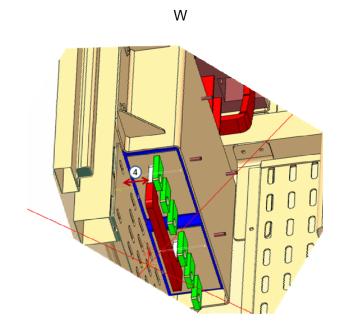



## PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**





CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 6 di 20

#### 6.3. INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI

#### Verifiche

- I. Verificare che i dispositivi indicati nell'Immagine 6.3.1 si trovino nell'armadio e siano fissati ed installati correttamente.
- II. Verificare che i dispositivi di protezione, posizioni 34 e 35 dell'Immagine 6.3.1 presentino le rispettive etichette identificative (vedere la tabella del paragrafo 3 dell'Allegato I).

#### Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 3 dell'Allegato I.



## PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

#### **ISPEZIONE ARMADIO LV1**

**LOCOMOTIVA E401** 




Mod. 11.02.BZ-02 C

CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 7 di 20

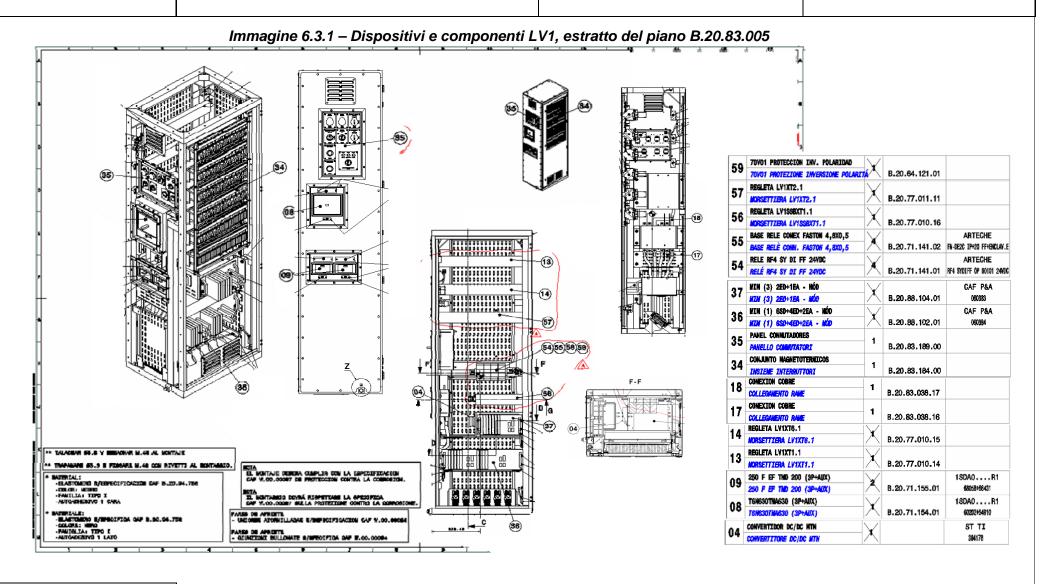





**LOCOMOTIVA E401** 



CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 8 di 20

## 6.4. PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE

#### Verifiche

- i. Verificare che nell'armadio siano presenti i seguenti cavi, contrassegnati in rosso ed enumerati nell'Immagine 6.4.1, e che la loro sezione coincida con quella indicata nella Tabella I.4.1.
- ii. Scegliere cinque cavi di messa a terra in modo casuale e verificare che i rispettivi collegamenti a vite siano eseguiti nel modo corretto (conformi).

Immagine 6.4.1 - Cavi PAT contrassegnati in rosso

#### Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 4 dell'Allegato I del presente documento.









CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 9 di 20

#### 6.5. CIRCUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI

#### Verifiche

Verificare 5 collegamenti scelti in modo casuale dei seguenti dispositivi, controllando che siano eseguiti nel modo corretto (conformi).

Nome elettrico	Numero Immagine 6.3.1	Codice CAF	Misura
07Q01	8	B0.200.710.1540.00	-
07Q02	9	B0.200.710.155.01	-
07Q03	9	B0.200.710.155.01	-
LV1XT2.1	2.1 57	B0.200.770.0110.11	M6
LVIAIZ.I		DU.200.770.0110.11	M10

#### Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 5 dell'Allegato I.

#### 6.6. MORSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI

Verifiche

Nella Tabella I.6.1 dell'Allegato I si trovano i morsetti a cui si collegano i conduttori esterni. Verificare che i morsetti a cui sono collegati i conduttori esterni siano correttamente identificati e che siano del tipo corretto.

• Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 6 dell'Allegato I.

#### 6.7. FUNZIONAMENTO MECCANICO

Verifiche

Verificare i mezzi di chiusura ed i cardini delle porte (aprire e chiudere le porte a 90°).

Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato I.





## PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**





CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 10 di 20

#### 6.8. CABLAGGIO, COMPORTAMENTO D'ESERCIZIO E FUNZIONALE

- Verifiche
  - i. Verificare che l'INSIEME sia etichettato e che tali etichette contengano le informazioni seguenti:
    - a. Nome del fabbricante
    - b. Numero identificativo (Numero di serie)
    - c. Data di fabbricazione
    - d. Norma IEC-61439-1
  - ii. Selezionare 5 cavi unifilari in modo casuale e verificare che la loro identificazione coincida con quella indicata nell'elenco dei cavi.
- Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 8 dell'Allegato I.



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**



Mod. 11.02-BZ-04 A

**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.591.00	EDIZIONE: C	Pag. 11 di 20

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

# ALLEGATO I - RISULTATI OTTENUTI NELL'ISPEZIONE DI SERIE DELL'ARMADIO LV1

Versioni software in prova / Versioni software di sistema in prova:

Nº	Software	Versione
1	N/A	
2		
3		
4		
5		

Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:

Nº	Dispositivo	Marca	Modello	Nº di serie	Prossima data di taratura
1					
2					
3					
4					
5					

Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:

Nº	Marca	Modello	Nº di serie	Fornitore	Nome del software utilizzato	Versione	Prossima data di validazione
1							
2							
3							
4							
5							

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
	<u>.</u>



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.591.00

EDIZIONE: C

Pag. 12 di 20

VEICOLO	UNITÀ:	

## 1. GRADO DI PROTEZIONE

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva dell'armadio LV1	L'involucro e i dispositivi accessibili coincidono con quelli del disegno B.20.83.005. Non sono presenti anomalie (NCR) e le aperture non sono danneggiate a tal punto da influire sul grado di protezione dell'armadio.	Sì No

## 2. DISTANZE DI ISOLAMENTO E LINEE DI FUGA

Azione	Risultato da ottenere	Valido
Ispezione visiva dell'armadio LV1	Le piastre 1 e 2 rispettano la geometria e la posizione indicate nel piano B.20.83.005, rispettivamente posizioni 18 e 17.	Sì No


Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod. 11.02-BZ-04 A	



Automation

## PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI (RISULTATI IN FABBRICA)

## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**



CODICE: B.20.92.591.00	EDIZIONE: C	Pag. 13 di 20

	1	
VEICOLO	UNITÀ:	

### 3. INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva	I dispositivi indicati nell'Immagine 6.3.1 sono fissati e installati correttamente.	Sì No
dell'armadio LV1	I dispositivi indicati nella Tabella I.3.1 (posizioni 34 e 35 dell'Immagine 6.3.1) si trovano nell'armadio e sono correttamente fissati, installati ed identificati.	Sì No

### Tabella I.3.1 – Dispositivi di protezione

Impianto elettrico	L'impianto è fissato, installato ed identificato all'interno dell'armadio	
	Sì	No
07Q01		
07Q02		
07Q03		
07Q04		
08Q01		
10Q01		
10Q02		
12Q01		
12Q02		
13Q01		
13Q02		
14Q01		
14Q02		
14Q03		
14Q04		
15Q01		
15Q02		
16Q01		
17Q01		

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod. 11.02-BZ-04 A	



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**





**CODICE: B.20.92.591.00 EDIZIONE: C** Pag. 14 di 20

VEICOLO	UNITÀ:	
---------	--------	--

Impianto elettrico	L'impianto è fissato, installato ed identificato all'interno dell'armadio	
	Sì	No
18Q01		
18Q02		
18Q03		
18Q04		
20Q01		
21Q01		
21Q02		
21Q03		
21Q04		
25Q01		
25Q02		
30Q01		
30Q02		
32Q01		
41Q01		
47Q01		
50Q01		
60Q01		
60Q02		
61Q01		
61Q02		
63Q01		
70Q01		
70Q06		
72Q01		
72Q02		
73Q01		
73Q02		
76Q01		
76Q02		
87Q01		
87Q02		
87Q03		
87Q04		

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**





**CODICE: B.20.92.591.00 EDIZIONE: C** Pag. 15 di 20

VEICOLO	UNITÀ:	
---------	--------	--

Impianto elettrico	L'impianto è fissato, installato ed identificato all'interno dell'armadio	
	Sì	No
87Q05		
87Q06		
87Q07		
87Q08		
87Q09		
87Q10		
90Q01		
90Q02		
90Q03		
91Q01		

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
	•



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 16 di 20

VEICOLO	UNITÀ:	

## 4. PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva	I cavi numerati nell'Immagine 6.4.1 hanno la sezione indicata nella Tabella I.4.1	Sì No
dell'armadio	I collegamenti elettrici dei 5 cavi selezionati nella Tabella I.4.1 sono eseguiti correttamente (conformi).	Sì No

#### Tabella I.4.1 - Sezione dei cavi PAT nel LV1

Numero	Sezione	Sezione del cavo	Va	lido	Selezionare 5
di cavo	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	Sì	No	cavi (indicare con "X")
1	4	-			
2	4				
3	10				
4	10	-			
5	10				
6	10				
7	10	-			
8	10				
9	10				
10	10				

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod. 11.02-BZ-04 A	



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.591.00 EDIZIONE: C** Pag. 17 di 20

VEICOLO	UNITÀ:	

## 5. CIRCUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI

	Colle	egamento verif	icato	Risultato da	Valido	
Azione	Impianto	Codice CAF	Misura	ottenere	Valido	
	elettrico	000100 0711	modia		Sì	No
				Il collegamento elettrico è avvitato correttamente.		
Ispezione visiva						

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Data:	Data:



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**





**CODICE: B.20.92.591.00 EDIZIONE: C** Pag. 18 di 20

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

## 6. MORSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva dell'armadio LV1	I morsetti dei dispositivi numerati nella Tabella I.6.I presentano l'indicazione menzionata nel risultato da ottenere e sono del tipo indicato.	Sì No

#### Tabella I.6.I – Morsetti per conduttori esterni

	Numero			Val	ido
Impianto elettrico	Immagine 6.3.1	- moreatti iino		Sì	No
		04			
Morsettiera		05	Perno		
LV1XT2.1	8	01			
LV IXIZ.I		12	Morsa		
		32			
Termico 07Q01	9	1			
Terrifico 07 Q01	9	5			
Termico 07Q02	9	2	Vite		
		5	vite		
Termico 07Q03	57	2			
Terrifico 07Q03	37	5			

## 7. FUNZIONAMENTO MECCANICO

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva dell'armadio LV1	Il funzionamento meccanico dei mezzi di chiusura e dei cardini dell'involucro è corretto.	Sì No

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



## **ISPEZIONE ARMADIO LV1**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.591.00

**EDIZIONE: C** 

Pag. 19 di 20

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

## 8. CABLAGGIO, COMPORTAMENTO D'ESERCIZIO E FUNZIONALE

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva dell'armadio LV1	L'INSIEME è etichettato e tale etichetta contiene le seguenti informazioni:  a. Nome del fabbricante b. Numero identificativo (Num. di serie) c. Data di fabbricazione d. Norma IEC-61439-1	Sì No
	L'identificazione dei cavi selezionati nella Tabella I.8.1 coincide con quella indicata nei diagrammi dei cavi.	Sì No

#### Tabella I.8.1 – Cavi selezionati

Nome del cavo selezionato	Dispositivo e morsetto di collegamento indicati nelle etichette	Dispositivo e morsetto di	Coincide	
		collegamento indicati nell'elenco dei cavi (B.20.77.141.01)	Sì	No

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod. 11.02-BZ-04 A	



711	ISPEZIONE ARMADIO LV1				
CAF		LOCOMOTIVA E401			
Power & Automation	C	CODICE: B.20.92.591.00	EDIZIONE: C		Pag. 20 di 20
VEIC	OLO		UNITÀ:		
ALLEC	SATC	II - CONCLUSIONE			
In confor nell'Allega	mità a ato I de	Il procedimento di ispezione del presente documento, il risultato	el paragrafo 6 e o del protocollo è rit	ai risultati tenuto:	ottenuti riportati
		Valido	Non val	ido	
<u>Osserva:</u>	zioni:				
Nome Operator Firma: Data:	re:	F	Iome R. Collaud irma: Data:	i:	
Data. Nome R. Qualit Firma: Data:	à:	N F	lome R. Cliente: Firma: Data:		

Mod. 11.02-BZ-04 A

Data:
