



ISPEZIONE ARMADIO LV2





CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 1 di 15

Concetto: PROVE ROUTINE IN FABBRICA

CONTROLLO EDIZIONE

EDIZIONE	MOTIVO	DATA
-	Edizione	01-11-2015
А	Aggiornato punti 6.2-6.3-Tabela I.3.1	24-05-2016
В	Correzioni traduzione	08-06-2016
С	Cambio formato	22-06-2016

DISTRIBUZIONE

Direzione del progetto	(A. URRIZA)
Responsabile per il progetto tecnico	(A. BALDA)
Responsabile della Qualità	(M. BUCCARELLA)
Ingegnere Area Sistemi	(A. FAGET)
Responsabile produzione	(J.C. GONZÁLEZ)
Responsabile prove dei treni	(A. CARDINALE)

Eseguito da:

Nome: F. IRASTORZA

Firma:

Data: 22-06-2016

Verificato da:

Nome: M. BUCCARELLA

Firma:

Data: 22-06-2016

Approvato da:

Nome: A. EGUIZABAL

Firma:

Data: 22-06-2016

Mod. 11.02.BZ-02 C

C4F

PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

ISPEZIONE ARMADIO LV2





CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 2 di 15

INDICE

1.	SC	OPO	3
2.	ΑP	PLICAZIONE	3
3.	RIF	FERIMENTI	3
4.	ΑТ	TREZZATURE	3
5.	CO	ONDIZIONI INIZIALI	3
6.	PR	ROCEDIMENTO DI ISPEZIONE	3
6	.1.	GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI	3
6	.2.	INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI	4
6	.3.	PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE	6
6	.4.	CIRCUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI	7
6	.5.	MORSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI	7
6	.6.	FUNZIONAMENTO MECCANICO	7
6	.7.	CABLAGGIO, PERFORMANCE OPERATIVA E FUNZIONALE	8
ALL	.EG	ATO I - RISULTATI OTTENUTI NELL'ISPEZIONE DI SERIE DELL'ARMADIO LV2	9
1.	GR	RADO DI PROTEZIONE	.10
2.	INT	TEGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI	.10
3.	PR	ROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE	.11
4.	CIF	RCUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI	.12
5.	MC	DRSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI	.13
6.	FU	INZIONAMENTO MECCANICO	.13
7.	CA	ABLAGGIO, PERFOPRMANCE OPERATIVA E FUNZIONALE	.14
ALL	.EG	ATO II - CONCLUSIONE	.15





ISPEZIONE ARMADIO LV2



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 3 di 15

1. SCOPO

Lo scopo di questo protocollo è quello di descrivere le attività di ispezione di serie da effettuare su ogni armadio LV2. Il protocollo include i fogli di raccolta dati del risultato di tali ispezioni.

2. APPLICAZIONE

Questo protocollo di ispezione è applicabile agli armadi LV2.

3. RIFERIMENTI

Norma EN 61439:2009 Insieme dei quadri a bassa tensione – Regole generali

Documenti CAF
 B.20.83.005.00: Armadio LV2

B.20.77.144.01: Elenco dei cavi LV2

B.20.94.765.00: Documento giustificativo della norma EN

61439-1:2009 per l'armadio LV

4. ATTREZZATURE

• Elementi necessari per aprire meccanicamente le porte.

5. CONDIZIONI INIZIALI

• L'armadio deve essere montato con tutti i suoi componenti, in posizione verticale, appoggiato sulla base e non sottoposto a tensione.

6. PROCEDIMENTO DI ISPEZIONE

6.1. GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI

Verifiche

Ispezionare visivamente l'involucro dell'INSIEME e verificare che questo coincida con quello del disegno B.20.83.005. Indicare se sono presenti anomalie (NCR) o se le aperture sono danneggiate a tal punto da influire sul grado di protezione dell'involucro.

Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 1 dell'Allegato I.





ISPEZIONE ARMADIO LV2

LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 4 di 15

6.2. INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI

- Verifiche
 - I. Verificare che i dispositivi indicati nell'Immagine 6.2.1 si trovino nell'armadio e siano fissati ed installati correttamente.
- Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 3 dell'Allegato I.



ISPEZIONE ARMADIO LV2






CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 5 di 15

Immagine 6.2.1 – Dispositivi e componenti LV2, estratto del piano B.20.83.006

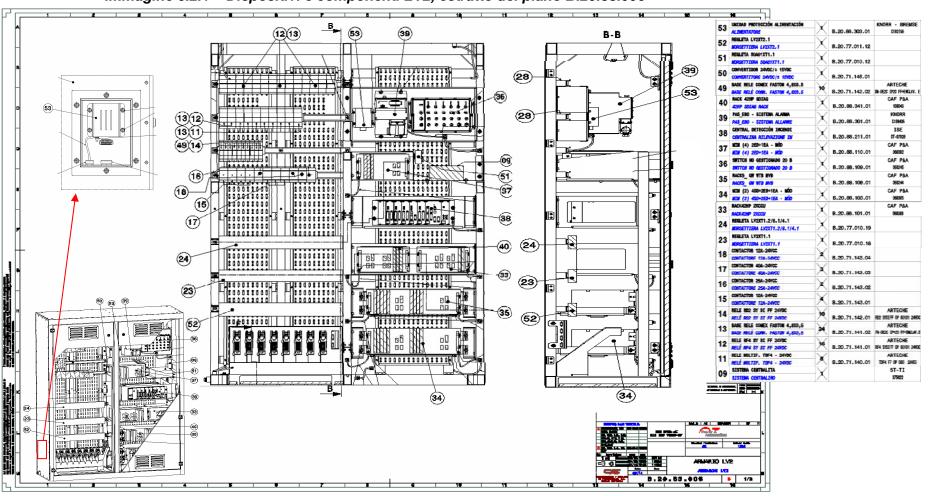



ISPEZIONE ARMADIO LV2





CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 6 di 15

6.3. PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI **PROTEZIONE**

Verifiche

- i. Verificare che nell'armadio siano presenti i seguenti cavi, contrassegnati in rosso e enumerati nell'Immagine 6.3.1 e che la loro sezione coincida con quella indicata nella Tabella I.3.1.
- ii. Scegliere 5 cavi di messa a terra in modo casuale e verificare che i rispettivi collegamenti a vite siano eseguiti nel modo corretto.

aaaaaaa

Immagine 6.3.1 - Cavi PAT contrassegnati in rosso

Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 4 dell'Allegato I del presente documento.





ISPEZIONE ARMADIO LV2





CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 7 di 15

6.4. CIRCUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI

Verifiche

Verificare i collegamenti del seguente dispositivo, controllando che siano eseguiti nel modo corretto (conformi).

Nome elettrico Numero Immagine 6.3.1		Codice CAF	Misura
LV2XT2.1	52	B0.200.770.0110.12	M6

• Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 5 dell'Allegato I.

6.5. MORSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI

Verifiche

Nella Tabella I.6.1 dell'Allegato I si trovano i morsetti a cui si collegano i conduttori esterni. Verificare che i morsetti a cui sono collegati i conduttori esterni siano correttamente identificati e che siano del tipo corretto.

Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 6 dell'Allegato I.

6.6. FUNZIONAMENTO MECCANICO

Verifiche

Verificare i mezzi di chiusura ed i cardini delle porte (aprire e chiudere le porte a 90°).

• Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato I.





ISPEZIONE ARMADIO LV2



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 8 di 15

6.7. CABLAGGIO, PERFORMANCE OPERATIVA E FUNZIONALE

- Verifiche
 - i. Verificare che l'INSIEME sia etichettato e che tale etichetta contenga le informazioni seguenti:
 - a. Nome del fabbricante
 - b. Numero identificativo (Numero di serie)
 - c. Data di fabbricazione
 - d. Norma IEC-61439-1
 - ii. Selezionare 5 cavi unifilari in modo casuale e verificare che la loro identificazione coincida con quella indicata nell'elenco dei cavi.
- Raccolta dei risultati

I risultati ottenuti nel corso dell'ispezione sono riportati nel paragrafo 8 dell'Allegato I.



ISPEZIONE ARMADIO LV2



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.593.00	EDIZIONE: C	Pag. 9 di 15

VEICOLO	UNITÀ:	

ALLEGATO I - RISULTATI OTTENUTI NELL'ISPEZIONE DI SERIE DELL'ARMADIO LV2

Versioni software in prova / Versioni software di sistema in prova:

Nº	Software	Versione
1	N/A	
2		
3		
4		
5		

Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:

Nº	Dispositivo	Marca	Modello	Nº di serie	Prossima data di taratura
1					
2					
3					
4					
5					

Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:

Nº	Marca	Modello	Nº di serie	Fornitore	Nome del software utilizzato	Versione	Prossima data di validazione
1							
2							
3							
4							
5							

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
	<u>.</u>
Mod 11 02-B7-04 A	



ISPEZIONE ARMADIO LV2



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.593.00 EDIZIONE: C Pag. 10 di 15

VEICOLO	UNITÀ:	
VLIGGEG	OIIIIA.	

1. GRADO DI PROTEZIONE

Azione	Azione Risultato da ottenere	
Ispezione visiva dell'armadio LV2	L'involucro coincide con quello del disegno B.20.83.006. Non sono presenti anomalie (NCR) e le aperture non sono danneggiate a tal punto da influire sul grado di protezione dell'involucro.	Sì No

2. INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI INCORPORATI

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva dell'armadio LV2	I dispositivi indicati nell'Immagine 6.2.1 sono fissati e installati correttamente.	Sì No

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



ISPEZIONE ARMADIO LV2



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 11 di 15

VEICOLO	UNITÀ:	

3. PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva	I cavi enumerati nell'Immagine 6.3.1 hanno la sezione indicata nella Tabella I.3.1	Sì No
dell'armadio	I collegamenti elettrici dei 5 cavi selezionati nella Tabella I.3.1 sono eseguiti correttamente (conformi).	Sì No

Tabella I.3.1 – Sezione dei cavi PAT nel LV2

Numero	Sezione	Sezione del cavo	Valido		Selezionare 5	
di cavo	(mm^2)	(mm^2)	Sì	No	cavi (indicare con "X")	
1	4					
2	4					
3	4					
4	4					
5	4					
6	4					
7	4					
8	4					
9	4					
10	4					
11	10					
12	10					
14	10					
14	10					
15	10					

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod. 11.02-BZ-04 A	



ISPEZIONE ARMADIO LV2





Mod. 11.02-BZ-04 A

CODICE: B.20.92.593.00

EDIZIONE: C

Pag. 12 di 15

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

Numero	Sezione	Sezione del cavo	Valido		Sezione del cavo Valid		Selezionare 5
di cavo	(mm^2)	(mm^2)	Sì	No	cavi (indicare con "X")		
16	10						
17	10						
18	10						
19	10						
20	10						
21	10						
22	10						
23	10						
24	4						

4. CIRCUITI ELETTRICI INTERNI E COLLEGAMENTI

Azione	Risultato da ottenere	Valido		
ALIGIIO	Tribultato da ottolioro	Sì	No	
Ispezione visiva	I collegamenti elettrici dell'impianto sono eseguiti in modo corretto (conformi).			

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



ISPEZIONE ARMADIO LV2



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.593.00 EDIZIONE: C Pag. 13 di 15

VEICOLO UNITÀ:

5. MORSETTI PER CONDUTTORI ESTERNI

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva dell'armadio LV2	I morsetti dei dispositivi numerati nella Tabella I.6.I presentano l'indicazione menzionata nel risultato da ottenere e sono del tipo indicato.	Sì No

Tabella I.6.I – Morsetti per conduttori esterni

Impianto			o da ottenere	Valido	
elettrico	Numero inimagine 6.2.1	morsetti	Tipo	Sì	No
		01			
		02	Perno		
Morsettiera	50	03			
LV2XT2.1	52	06			
		25	Morsa		
		26			

6. FUNZIONAMENTO MECCANICO

Azione	Risultato da ottenere	valido
Ispezione visiva dell'armadio LV2	Il funzionamento meccanico dei mezzi di chiusura e dei cardini dell'involucro è corretto.	Sì No

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod 11.02-B7-04.A	



ISPEZIONE ARMADIO LV2



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.593.00 EDIZIONE: C Pag. 14 di 15

VEICOLO	UNITÀ:	
VEICOLO	UNITA.	

7. CABLAGGIO, PERFOPRMANCE OPERATIVA E FUNZIONALE

Azione	Azione Risultato da ottenere	
Ispezione visiva dell'armadio LV2	L'INSIEME è etichettato e tale etichetta contiene le seguenti informazioni: a. Nome del fabbricante b. Numero identificativo (Num. di serie) c. Data di fabbricazione d. Norma IEC-61439-1	Sì No
	L'identificazione dei cavi selezionati nella Tabella I.8.1 coincide con quella indicata nei diagrammi dei cavi.	Sì No

Tabella I.8.1 – Cavi selezionati

Name del cova Dispositivo e morsetto di		Dispositivo e morsetto di	Coincide	
Nome del cavo selezionato	collegamento indicati nelle etichette	mento indicati nelle	Sì	No

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
	·
Mod 11 02-B7-04 Δ	



ISPEZIONE ARMADIO LV2



CAF	LC	COMOTIVA E401	
Power & Automation	CODICE: B.20.92.593.00	EDIZIONE: C	Pag. 15 di 15
VEIC	OLO	UNITÀ:	
ALLEC	GATO II - CONCLUSIONE	<u> </u>	
In confor nell'Allega	rmità al procedimento di ispezione dato I del presente documento, il risulta	del paragrafo 6 ed ai risult to del protocollo è ritenuto:	ati ottenuti riportati
	Valido	Non valido	
<u>Osservaz</u>	zioni:		
ome Operator	re:	Nome R. Collaudi:	

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:

Mod. 11.02-BZ-04 A
